

АКТ

прийомки-передачі

лінійних телефонних споруд з фрагментом телефонної каналізації
за адресою: м.Тернопіль, вул. Бережанська, буд. № 53а з розподільною мережею
по зазначеному будинку

м.Тернопіль

18 вересня 2006 р.

ТзОВ „Стар Софт” в особі директора Паронова С.В., що діє на підставі Статуту з однієї сторони та ЗАТ „Агробуд” в особі Голови правління Присяжнюка Ю.К., що діє на підставі Статуту з іншої сторони (надалі – „Сторони”), підписали цей акт про наступне:

ЗАТ „Агробуд” передав на безоплатній основі зі свого балансу, а ТзОВ „Стар Софт” прийняв на безоплатній основі на свій баланс лінійну телефонну споруду з фрагментом телефонної каналізації по вул. Бережанська, буд. № 53а, яка складається з наступних складових:

1. Колодязь ККЗ-3 телефонної каналізації, влаштований на трасі між колодязями № 582 та № 935 ВАТ „Укртелеком” по вул. Бережанській (на відстані 13,6 м. від колодязя № 582, що знаходиться біля буд. № 2 по вул. Надзбручанська).
2. Колодязь ККС-1, з'єднаний одноканальною телефонною каналізацією з колодязем, зазначеним в п.1. цього акту по вул. Бережанській і розташований на відстані 15,0 від буд. № 53а по вул. Бережанській.
3. А/ц канал телефонної каналізації діам. 100 мм. Прокладений від колодязя, зазначеного в п.1. цього акту до колодязя, зазначеного в п.2. цього акту довжиною – **40,0 м.** та а/ц канал телефонної каналізації діам. 100 мм. прокладений від колодязя, зазначеного в п.2. до буд. № 53а по вул. Бережанській загальною довжиною – **15,5 м.** виконані згідно Акту на приховані роботи з будівництва кабельної каналізації - прокладання трубопроводів.
4. Кабель ТПП 50*2*0,4 прокладений частково в діючий, частково в збудованій каналізації довжиною – **176 м.** від шафи ВАТ „Укртелеком”, яка розташована по вул. Бережанській, буд. № 49; проходить по колодязях № 2572, № 935 ВАТ „Укртелеком” та колодязях, зазначених в п.1. та п.2. цього акту до будинку № 53а по вул. Бережанській, прокладений згідно Акту відповідності виконаних робіт умовам і правилам будівництва.
5. Кабель ТПП 30*2*0,4 прокладений частково в діючий, частково в збудованій каналізації довжиною – **176 м.** від шафи ВАТ „Укртелеком”, яка розташована по вул. Бережанській, буд. № 49; проходить по колодязях № 2572, № 935 ВАТ „Укртелеком” та колодязях, зазначених в п.1. та п.2. цього акту до будинку № 53а по вул. Бережанській, прокладений згідно Акту відповідності виконаних робіт умовам і правилам будівництва.

6. Кабель ТПП 30*2*0,4 прокладений в трубці по будинку № 53а по вул. Бережанській загальною довжиною – **50 м.**, прокладений згідно Акту відповідності виконаних робіт умовам і правилам будівництва.
7. Кабель ТПП 50*2*0,4 прокладений в трубці по будинку № 53а по вул. Бережанській загальною довжиною – **35 м.**, прокладений згідно Акту відповідності виконаних робіт умовам і правилам будівництва.
8. Кабель ТПП 10*2*0,4 прокладений в трубці по будинку № 53а по вул. Бережанській загальною довжиною – **80 м.**, прокладений згідно Акту відповідності виконаних робіт умовам і правилам будівництва.
9. Бокс БКТ 100*2*0,4, розташований в шафі РШ 53-31 ВАТ „Укртелеком” біля будинку № 49 по вул. Бережанській, змонтований згідно Акту відповідності виконаних робіт умовам і правилам будівництва.
10. КРТ 10*2 в кількості **9 шт.**, будинку № 53а по вул. Бережанській, установлені згідно Акту відповідності виконаних робіт умовам і правилам будівництва.

Вартість лінійної споруди, зазначеної в п.1-10 цього акту Сторони оцінили в **10.484,00** (десять тисяч чотириста вісімдесят чотири) гривні.
Сторони одна до одної претензій не мають.

Голова правління
ЗАТ „Агробуд”

Присяжнюк Ю.К.

Директор
ТЗОВ „Стар Софт”

Паронов С.В.

Схема

применение кабелей ТПТ 30x2+0,4 Тп
 ТПТ 50x2+0,4 по территории каменного
 б-г шп 33-31 по 72 км. м.д. б-г. бр.м.с.б.с.с.

Борисов
 № 49



15.7

ККЗ-3

14.0

-с 3.4 -

-2.0

по 0,5 м/с
 № 2

7+0


0+1
 -15.5-

ККЗ-2


3.4.8.2.5

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ"
 ПОГОДЖЕНО №
 Перед виконанням земляних робіт виконати
 місце робіт нашої проєкції по плану № 58-С8
 Конфлікт ліній електрики
 ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
 МІСЦЕВОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ'ЯЗКУ
 "12" 05 20 05

Схема противобудивничого каналу

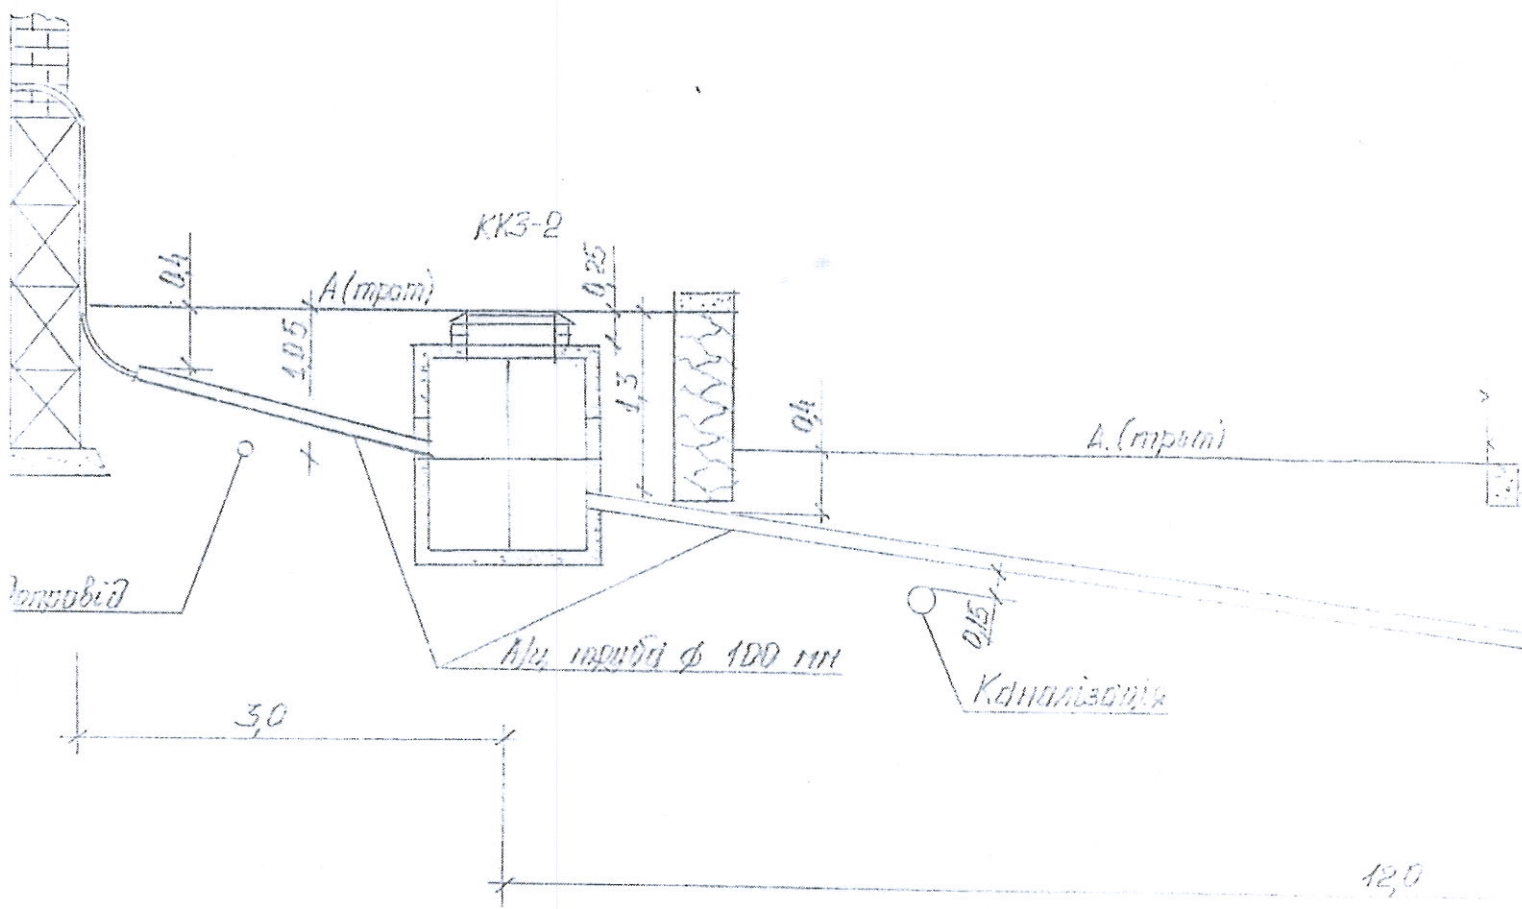


11/21

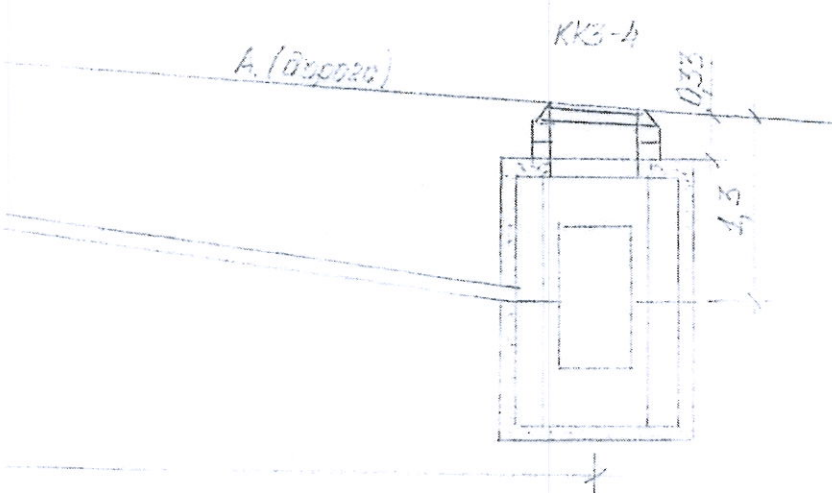

21-52-54-5-7-3

		Лист



ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ЦТЕ МТЗ

Л.М.Барабан
200_р.

АКТ

Складений виконавцем робіт Гудимка Т.В. (ПМП "ОМЕЛА")

Замовником Заст. голови правління
ЗАТ "АГРОБУД" Чавача Я.М.

Представником ЦТЕ МТЗ нач. цеху ТЕ ЛС Курчик М.І
72^х квартирного житлового
про те, що роботи по зовнішній і внутрішній телефонізації виконані згідно умов і правил
будівництва

Будинку по вул. Буретянська
№ 7 № 33 (від 12.03.09) завершили

(назва об'єкту і адреса)		
№	ОБСЯГ РОБІТ	Кількість
1.	Прокладка кабелю ТПП 50x2+0,4 в трл. каналі	176м
2.	То же, ТПП 30x2+0,4 - "	176м
3.	Прокладка кабелю ТПП 30x2 50м в прет. трубі по буд.	
4.	То же, ТПП 50x2+0,4 по буд.	35м
5.	То же, ТПП 10x2+0,4 по буд.	80м
6.	Зарядка і установка БКТ 100x2 в шр 33-31	1шт.
7.	Зарядка і установка КРТ 10x2 в будинку	9шт.

Роботи виконувались 11-12-2009г

Виконавець Гудимка Т.В.

Замовник Чавача Я.М.

Начальник цеху ТЕ ЛС Курчик М.І.

Інженер ККС цеху ТЕ ЛС Дзесо С.М.

Представник техобліку Курчик А.П.

АКТ
на приховані роботи з будівництва
кабельної каналізації – будівництво колодязів

Об'єкт 42^х кв. м. Д.
Підрядчик ЗАТ "Аеробуд"
Ділянка Вор. м. Т. №49 вул. Берешанська
Найменування населеного пункту м. Тернопіль
Дата 08.11.2005р.

Ми, що далі підписалися, представник технічного нагляду замовника
Евдокименко Ігор Зензичук В.М.
(посада, прізвище, ім'я по батькові)
та представник підрядчика

Виконроб Сіохера М.В. ЗАТ "Аеробуд"
(посада, прізвище, ім'я по батькові)
зробили огляд виконаних робіт з колодязів кабельної каналізації
по вулиці Берешанській згідно з робочим кресленням проекту № _____ і виявили:
1. Загальні дані:

Номер колодязя за проектом	Тип колодязя	Матеріал	Період будівництва	Примітка
	ККЗ-3	З/Б	новобуд	
	ККЗ-1	З/Б	—	

2. Глибина котлованів для колодязів 2,0 м
3. Якість складання, замурування швів добре
4. Гідроізоляція колодязів виконана не передбачено
5. Засипання котлованів виконано з пошаровим ущільненням так
6. Правильність встановлення люка згідно СБН
7. Встановлення арматури обладнано кронштейнами

Роботи, виконані згідно з робочою документацією проекту і діючими правилами.

Представник технічного нагляду замовника

(підпис)

В.Зензичук

Представник підрядчика

(підпис)

М.Сіохера

АКТ
на приховані роботи з будівництва
кабельної каналізації – прокладання трубопроводів

Об'єкт: ТЗКв. м. Д. вул. Бережанська Найменування населеного
Підрядчик: ЗНТ "Керобус" пункту: Тернопіль
Ділянка: вул. Бережанська Дата: _____

Ми, що далі підписалися, представник технічного нагляду замовника
Степан Трохимчук Ігор. Веніамин В. М.
зробили огляд з прокладання трубопроводів кабельної каналізації згідно
робочим кресленням № 30-2004 по вул. Бережанська ві-
колодязя № _____ (будинок № _____) до колодязя № _____ (будинок № _____)
і виявили:

1. Загальні дані:

Ділянка між колодязями №	Довжина прольоту, м	Характеристики труб Матеріал	Довжина, м	Внутрішній діаметр, мм	Кількість каналів	Кількість стиків	Примітка
	40,0	а/н	4,0	Ø160	1	9	
	15,50	а/н	4,0	Ø100	1	3	

2. Спосіб з'єднання труб: н/с механічним
3. Глибина закладання підлоги блоку: 0,8 м
4. Провітні між трубами зашпаровані: —
5. Якість замурування стиків труб: добре
6. Прокідність каналів: в нормі


Роботи, виконані згідно з робочою документацією проекту і діючих
правил.

Представник технічного нагляду замовника: Веніамин В. М.

Представник підрядника:

Степан Трохимчук В

Тернопільська дирекція ВАТ «Укртелефаст»
ПОГОДЖЕНО
Перед виконанням земляних робіт викласти на місці роботи
засохлого представника по тал.
КОПАТИ ТІЛЬКИ ВРУЧНІ

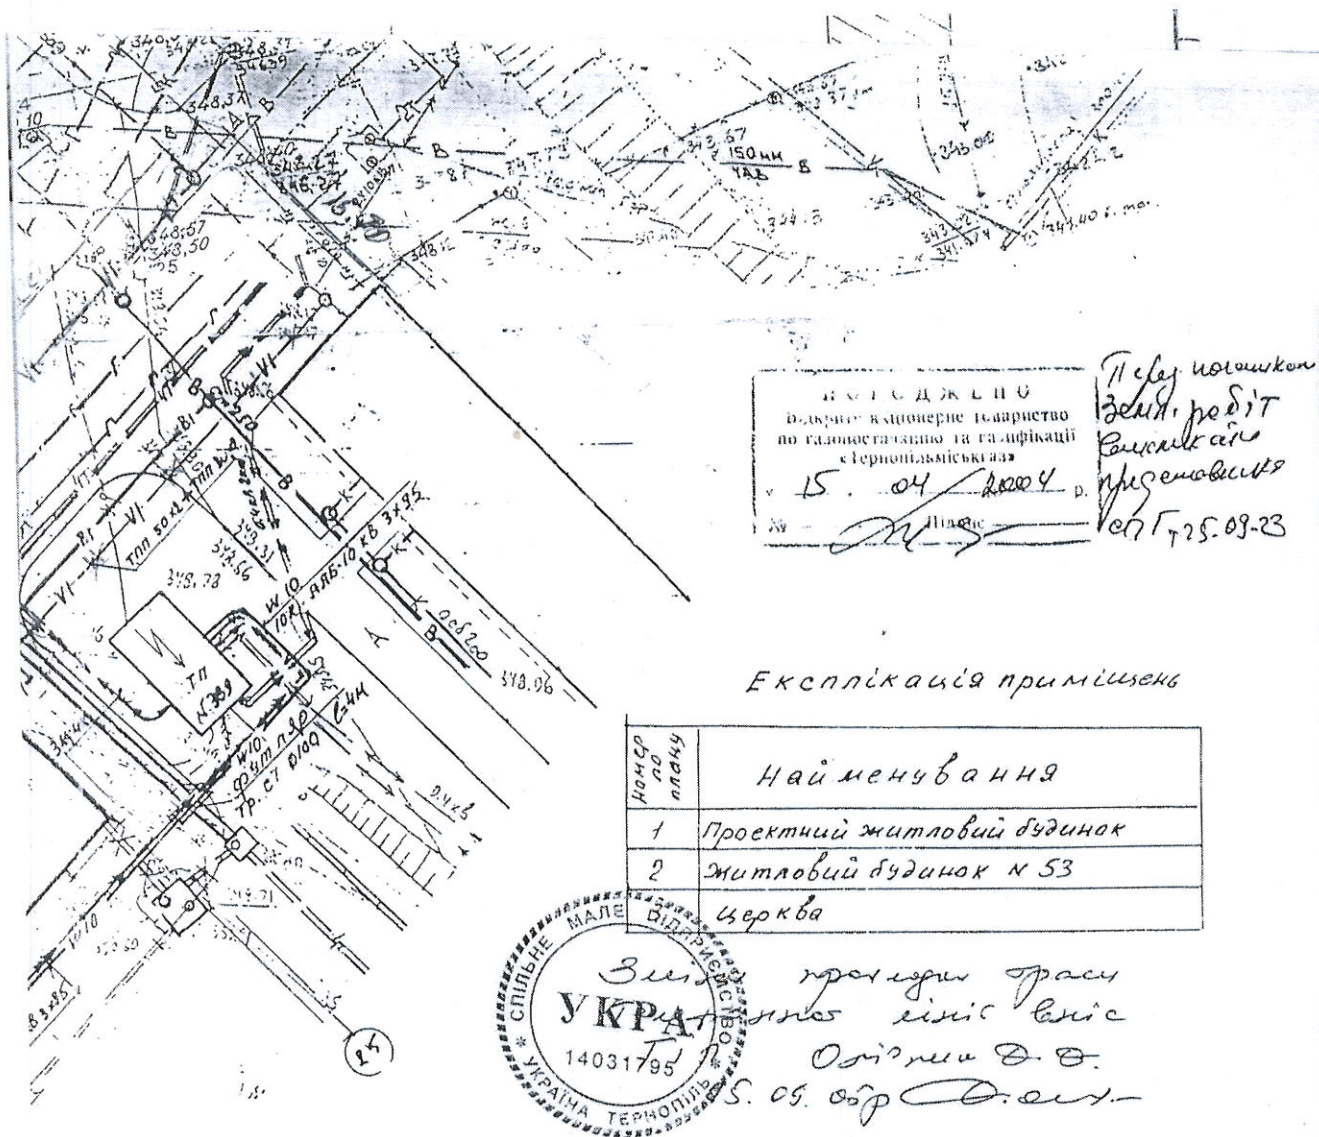

Примітка: 1. Кабельні електролінії 1к, 2к напр. 10кВ і 3к, 4к, 5к, 6к, 7к напр. 0,4кВ внесені на стадії підготовки майданчика під будівництво за його межі вважаються існуючими.

2. При перетині проєктуюваних кабелів з підземними інженерними комунікаціями габарити перетинення прийняти згідно вимог п. 2.3.94, 2.3.95, 2.3.96 ПУЕ-85 і типової серії 4-407-251.

ПОГОДЖЕНО
ПРОЕКТНІ РОБОТИ
ІНЖЕНЕРНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«НОПІЛЬВОДОКАНАЛ»

05.09.08 20.08.08

				30 -2004 ЗЕМ СВ		
				72-х квартирний житловий будинок з вбудованими стоянками автомобілів та закладів громадського призначення м. Тернопіль, вул.Бережанська		
				Житловий	Стійби	Аркуш
					Аркушів	
