


СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

квартирного(багатоповерхового) будинку

№ 1 літер «A-2»

вул. Червоножовтнева

місто Харків

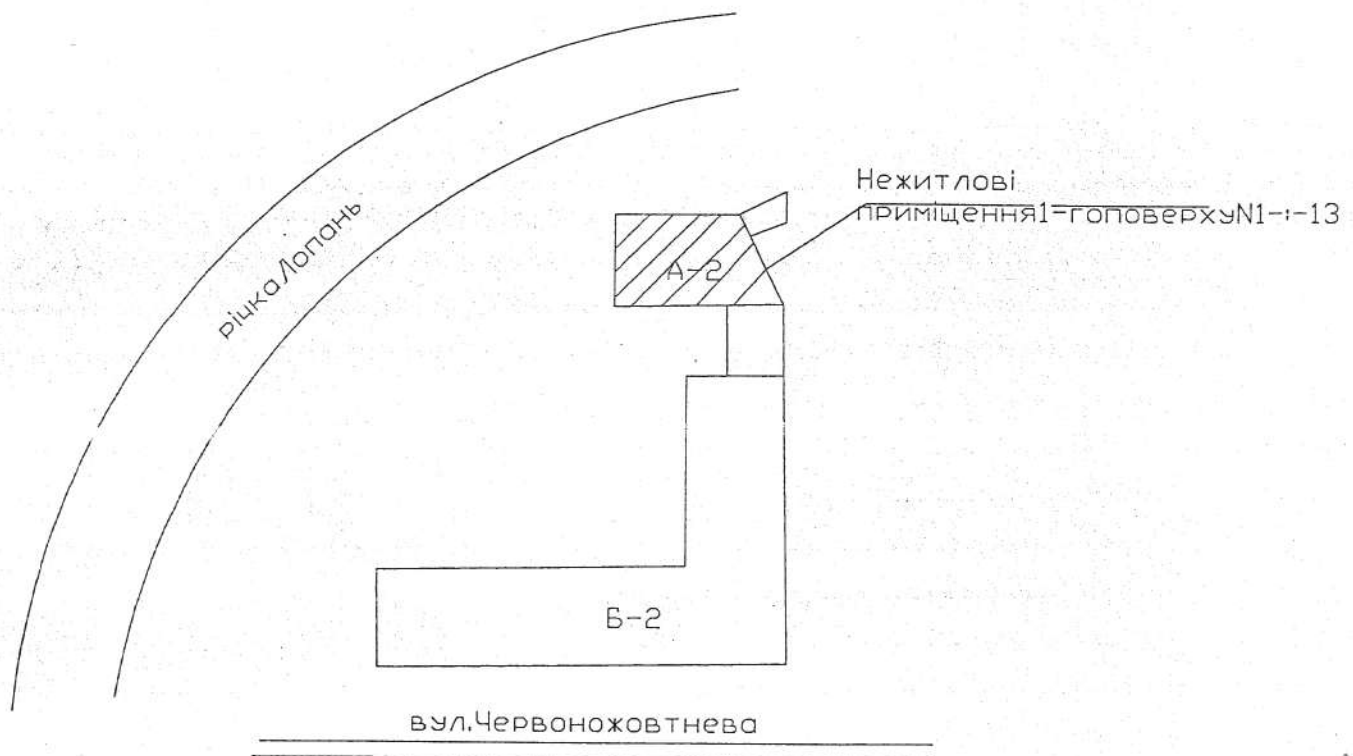

Експлікація							
Літер за планом	Назва будинку, господарських будівель та споруд	Загальна площа фрагменту	Площа земельної ділянки у. т. ч.				
			Під будинком, господарськими будівлями, та спорудами			Під зеленими насадженнями	Під дорожнім (твердим) покриттям
			Усього	Під будинком	Під господ. будівлями та споруд.		
1	2	3	4	5	6	7	8
A-2	1-го поверх	154,9	154,9				

Технічна характеристика багатоповерхового будинку

Загальні відомості

Серія проекту	_____	Кількість квартир (шт.)	_____
Рік побудови	<u>1917</u>	Кількість житлових кімнат (шт.)	_____
Кількість поверхів (шт)	<u>2(1)</u>	Матеріал стін	<u>цегла</u>
Площа забудови (м²)	<u>154,9</u>	Будівельна (балансова) вартість	_____
Об'єм будинку (м³)	<u>469</u>	Відсоток зносу	_____
Загальна площа (м²)	<u>109,0</u>	Інвентаризаційна вартість	_____
Житлова площа (м²)	_____		
Загальна площа квартир (м²)	_____		
Площа нежитлових приміщень (м²)	<u>109,0</u>		
Площа ганку (м²)	_____		

ПЛАН


вбудованих приміщень у квартирному (багатоповерховому) будинку

будинок № 1 літер « А-2 » вул. Червоножовтнева

місто Харків

Масштаб 1 : 100

1-й поверх

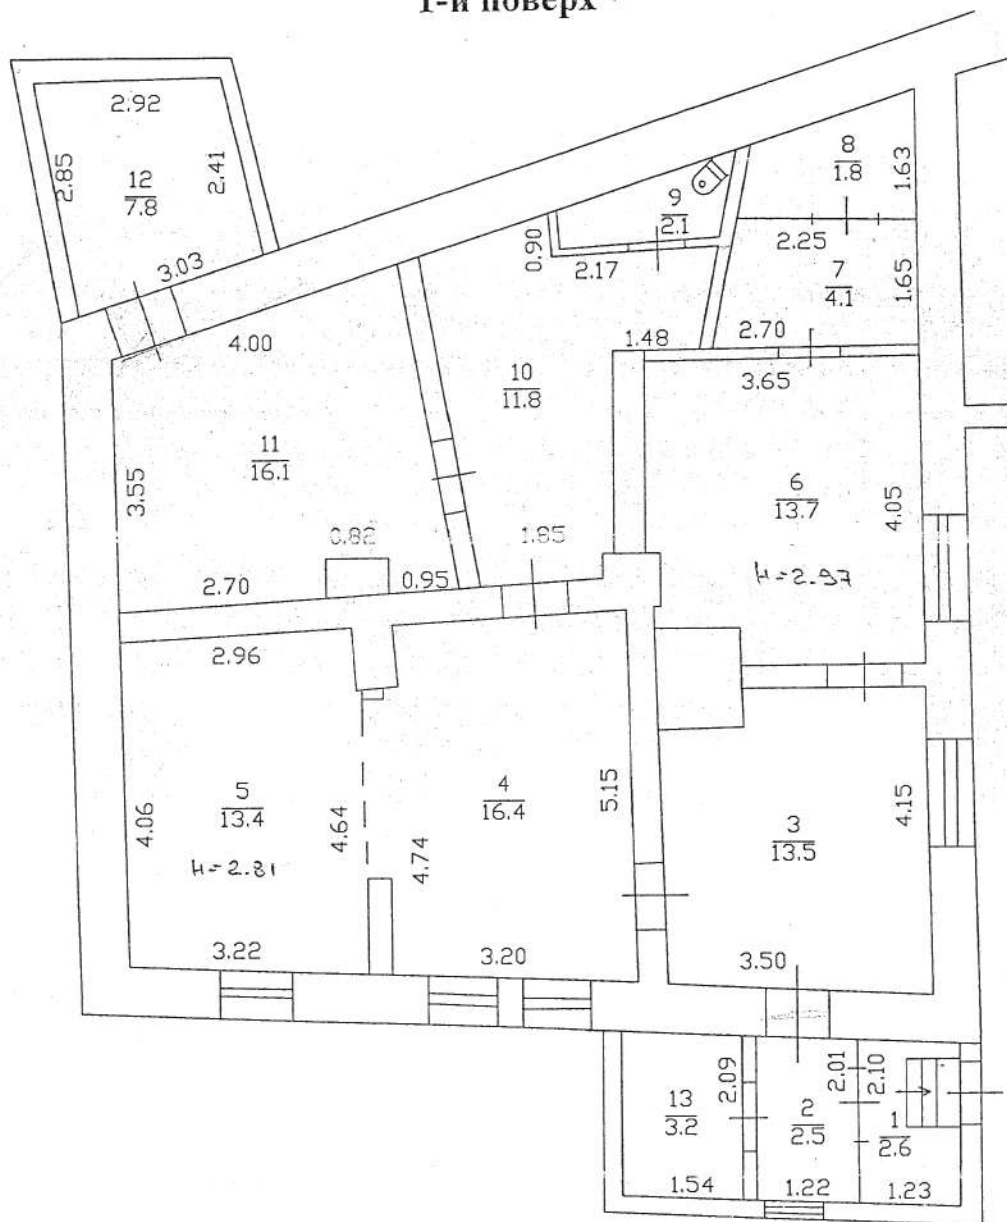

ЕКСПЛІКАЦІЯ

вбудованих приміщень у квартирному (багатоповерховому) будинку

будинок № _1_ літер „_А-2_“, вул. _Червоножовтнева_

місто _Харків_

Поверхи	№ квартири	Номери приміщень	Призначення приміщень	Площа приміщень (м²)				
				загальна	Житлова (основна)	допоміжна	нежитлова вбудована	
							основ-на	підсоб-на
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		1	тамбур	2,6				2,6
		2	коридор	2,5				2,5
		3	-/-	13,5				13,5
		4	художня майстерня	16,4			16,4	
		5	-/-	13,4			13,4	
		6	-/-	13,7			13,7	
		7	коридор	4,1				4,1
		8	комора	1,8				1,8
		9	санвузол	2,1				2,1
		10	коридор	11,8				11,8
		11	художня майстерня	16,1			16,1	
		12	комора	7,8				7,8
		13	комора	3,2				3,2
			Усього по 1-му пов.	109,0			59,6	49,4

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Найменування конструктивних елементів	Опис конструктивних елементів	% зносу
1	2	3
Фундамент	Цегляний т.0,65-:-0,85м	
Стіни	Цегла т.0,50-0,75м	
Перегородки	цегляні	
Перекриття (міжповерхові, надпідвальні, горищні)	дерево	
Підлога	бетон	
Покрівля (на суміщених горищних дахах)	Шифер	
Вікна	дерево	
Двері	дерево,метал	
Сходи	дерево	
Оздоблення зовнішнє		
Оздоблення внутрішнє		

ИНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ


[illegible]

Виконав



Зобов Г.А.

Нач. відділу



Павлішина К.К.

